UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

Laboratório de Desenvolvimento de Software

Cronograma do Projeto

Achei um Bicho — planejamento de 09/09/2026 a 21/11/2026

Disciplina: Laboratório de Desenvolvimento de Software · UFOPA

Professora: Carla Marina C. Paxiúba

Equipe: Bruna Kellen · Murilo Falcão · Rafael Nobre

Versão: 1.1, de 9 de setembro de 2026

Sumário

1. Os três marcos da disciplina

2. Quanto tempo sobrou

3. Semana a semana

4. As sprints em detalhe

- Sprint 0 · Fundação · 09/09 a 18/09
- Sprint 1 · Publicar e ver · 19/09 a 02/10
- Sprint 2 · Aproximar · 03/10 a 08/10
- Sprint 3 · Proteger · 10/10 a 23/10
- Sprint 4 · Fechar o ciclo · 24/10 a 06/11
- Sprint 5 · Fechamento · 07/11 a 20/11

5. Como a equipe se organiza

6. Riscos

7. O que sai primeiro se apertar

1. Os três marcos da disciplina


O plano de aula fixa três datas. Elas não se movem, e entrega fora do prazo vale zero.

Data	Marco	O que a disciplina cobra	Situação
28/08/2026	Kickoff Técnico	Equipe formada, desafio escolhido, funcionalidades do MVP definidas e pelo menos 5 telas de protótipo de média fidelidade	Entregue: 7 telas e 2 estados
09/10/2026	Alpha Release	Primeira versão do sistema rodando, apresentada	A fazer
21/11/2026	The Final Pitch	Versão final rodando, código-fonte, documentação e artigo em formato SBC	A fazer

Entre esses três encontros não há aula. O ritmo interno passa a ser responsabilidade da equipe, e é isso que torna o atraso perigoso: ele não aparece até a véspera. O resto deste documento existe para abrir essas três datas em algo que possa ser conferido toda semana.

2. Quanto tempo sobrou

Contando a partir de 9 de setembro, faltam 30 dias para o Alpha Release e 73 para o Pitch Final. Em semanas úteis, pouco mais de quatro e pouco mais de dez.

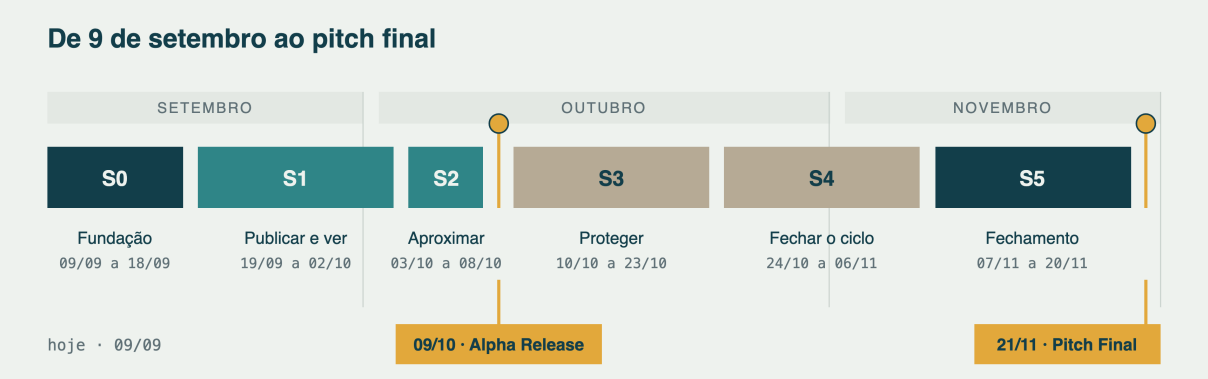

Linha do tempo com as seis sprints e os dois marcos restantes

O trecho apertado é o primeiro. Das quatro semanas até o alpha, a primeira e meia é fundação, sem código de produção nenhum. A escolha é deliberada: fundação malfeita cobra juros em outubro, quando já não há tempo para pagar.

3. Semana a semana

A tabela abaixo abre os três marcos da professora em onze semanas. É o documento que a equipe consulta na reunião semanal.

#	Período	Foco	O que precisa estar pronto no fim da semana

1	09/09 a 13/09	Fundação	Documento de visão, modelo ER e cronograma aprovados pela equipe
2	14/09 a 20/09	Fundação	Repositório no GitLab, monorepo, Docker subindo Postgres com PostGIS, prova de conceito da consulta por raio
3	21/09 a 27/09	Publicar	F1 e F2 no servidor, com testes; primeiras telas do aplicativo consumindo a API
4	28/09 a 04/10	Ver	F3 e F4 funcionando de ponta a ponta; build do aplicativo instalável num celular real
5	05/10 a 11/10	**Alpha em 09/10**	F5 pronto, dados de demonstração criados, roteiro ensaiado
6	12/10 a 18/10	Proteger	Perguntas de verificação e fluxo de reivindicação (F6)
7	19/10 a 25/10	Proteger	Liberação de contato (F7) com teste automatizado de vazamento
8	26/10 a 01/11	Fechar o ciclo	Estados, desfecho e tarefas agendadas (F8)
9	02/11 a 08/11	Fechar o ciclo	Fila offline (F9), suíte de testes completa, primeira rodada com protetores
10	09/11 a 15/11	Congelamento	Correções da rodada com protetores; artigo SBC em rascunho completo
11	16/11 a 22/11	**Pitch em 21/11**	Artigo revisado, documentação conferida, vídeo de reserva, dois ensaios cronometrados

4. As sprints em detalhe

Sprint 0 · Fundação · 09/09 a 18/09

Nenhuma linha de código de produção nesta sprint. Ela existe para que as seguintes não precisem adivinhar nada.

Entrega	Como se sabe que terminou	Responsável
Documento de visão	Aprovado pelos três em reunião	a definir
Modelo ER e esquema físico	Script SQL roda sem erro num banco vazio	a definir
Casos de uso e diagrama de classes	Diagramas versionados no repositório	a definir
Repositório estruturado	Qualquer integrante clona e encontra a estrutura pronta	a definir
Contêiner com Postgres e PostGIS	Um comando sobe o banco já com as tabelas criadas	a definir
Prova de conceito da consulta por raio	A consulta espacial retorna os casos ordenados por distância, usando índice	a definir
Vocabulário fechado com fonte única	Os tipos da aplicação e as restrições do banco derivam da mesma declaração	a definir
Modelo de configuração das duas aplicações	Nenhuma senha ou chave versionada	a definir

A prova de conceito do PostGIS entra logo na primeira sprint por um motivo: é a única parte da stack que ninguém da equipe já usou. Descobrir problema com ela em outubro seria descobrir tarde.

Sprint 1 · Publicar e ver · 19/09 a 02/10

O primeiro caminho completo do produto: publicar um caso e vê-lo aparecer no mural de outro aparelho.

Entrega	Funcionalidade	Critério
Cadastro de caso perdido, com atributos, local e perguntas de verificação	F1	Publicação completa em no máximo 4 passos
Cadastro de caso encontrado, sem conta, com código de edição	F2	Conclui sem informar e-mail ou senha
Consulta por raio no banco, com índice espacial	F3	O plano de execução confirma o uso do índice espacial
Mural com filtro e raio ajustável	F3	Distância em metros confere com o mapa
Tela de caso aberto	F4	Nenhum dado de contato aparece na resposta da API
Build do aplicativo e deploy da API	—	Aplicativo instalado num celular da equipe

Testes obrigatórios: unidade nas regras de publicação, e integração da consulta por raio contra um Postgres real em contêiner.

O item que costuma ser adiado e não pode ser é o último. Build e deploy precisam existir enquanto o aplicativo ainda está vazio, porque é quando quebrar custa barato.

Sprint 2 · Aproximar · 03/10 a 08/10

Seis dias, e é a sprint que fecha o alpha. Escopo mínimo por decisão.

Entrega	Funcionalidade
Registro de avistamento	F4
Gerador de pareamentos, determinístico	F5
Tela de pistas, com o que bateu e o que não bateu	F5
Dados de demonstração e roteiro ensaiado	—

Critério de pronto: publicar um caso do lado "achei" e ver o pareamento aparecer no caso "perdi" correspondente, com a lista de atributos coincidentes correta.

> ***09/10 · ALPHA RELEASE.*** *F1 a F5 rodando com dados criados pela equipe. Se alguma coisa não estiver pronta, apresenta-se o que existe. Slide no lugar de sistema é pior que funcionalidade faltando.*

Sprint 3 · Proteger · 10/10 a 23/10

Entrega	Funcionalidade
Fluxo de reivindicação e resposta às perguntas	F6
Decisão do autor e liberação de contato	F7
Registro de quem viu o quê, para auditoria	F7

Critério de pronto: alguém reivindica, responde as três perguntas, o autor do caso vê as respostas, e nenhum dado de contato aparece antes da liberação. Isso se verifica com teste automatizado sobre o corpo da resposta da API, não olhando a tela.

Sprint 4 · Fechar o ciclo · 24/10 a 06/11

Entrega	Funcionalidade
Estados do caso e desfecho obrigatório	F8
Tarefas agendadas de cobrança (9 dias) e expiração (15 dias)	F8
Fila de envio offline no aparelho	F9
Suíte de testes completa	—
Primeira rodada com protetores locais	—

Critério de pronto: um caso sem interação é cobrado e expira sozinho, sem ninguém rodar nada à mão.

A rodada com protetores fica nesta sprint, e não na última, porque o que ela revelar ainda precisa caber em algum lugar do calendário.

Sprint 5 · Fechamento · 07/11 a 20/11

Nenhuma funcionalidade nova. Quem abrir escopo aqui atrasa o pitch.

As entregas são cinco: as correções do que a rodada com protetores revelou, o artigo em formato SBC escrito e revisado, a documentação conferida contra o código que existe de fato, um vídeo curto de demonstração para o caso de a internet cair no dia, e dois ensaios do pitch, cronometrados.

> ***21/11 · THE FINAL PITCH.*** *Sistema rodando, código-fonte, documentação e artigo entregues.*

5. Como a equipe se organiza

Reunião de controle toda semana, dia e hora fixos, trinta minutos. Três perguntas: o que ficou pronto, o que travou, o que muda no plano. Como não há aula semanal, esse encontro é o único mecanismo que revela atraso a tempo.

As trilhas abaixo são sugestão; a alocação de nomes fica com a equipe.

Trilha	Escopo
Aplicativo	Telas, navegação, fila offline, consumo da API
API e banco	Módulos NestJS, migrations, consulta espacial, tarefas agendadas
Dados e documentação	Modelagem, UML, artigo SBC, conversas com protetores

Ninguém fica dono exclusivo de uma trilha. Toda entrega passa por revisão de outra pessoa antes de entrar na branch principal, e quem escreveu não revisa o próprio código.

Uma regra de trabalho não se negocia: nenhuma linha de código de produção antes do teste que ela faz passar, e o teste precisa ser visto vermelho antes de verde.

6. Riscos

Risco	Impacto	O que fazer antes que aconteça
Build do aplicativo e deploy da API escorregarem para outubro	Alto: o alpha vira slide	Subir os dois na Sprint 1, com o aplicativo ainda vazio
PostGIS levar mais tempo que o previsto para aprender	Médio	Prova de conceito da consulta por raio na Sprint 0
Sprint 2 ter só seis dias	Alto	Nada de escopo novo nela; o que não couber na Sprint 1 fica fora do alpha
Mural vazio na demonstração	Alto: o produto parece não funcionar	Fechar dois protetores parceiros até o fim de setembro
Artigo deixado para novembro	Alto	Escrever a fundamentação teórica ainda em setembro
Uma pessoa sobrecarregada	Médio	A revisão cruzada obrigatória expõe o desequilíbrio cedo
Escopo crescer na Sprint 5	Alto	A Sprint 5 é congelada por definição

7. O que sai primeiro se apertar

Ordem de construção: F1, F3, F2, F4, F5, F8, F6, F7, F9.

Se o prazo apertar, F9 (publicação offline) é a primeira a sair, e é a única que sai sem quebrar a história do produto. F6 e F7 ficam de qualquer jeito: sem elas o sistema não tem resposta para como impedir que alguém leve o animal de outra pessoa.
